

## GARE PARIS LYON

### ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 88

Date de diffusion	<b>27/03/2023</b>	<b>DESTINATAIRES :</b>	
		AREP – GARE ET CONNEXIONS - PARVIS	
Réf Rapport : ALEA CONTROLES	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>20-03-2023</b>
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>20-03-2023</b>
Semaine de surveillance	<b>Semaine 12-23</b>	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
<b>Objet :</b>	<b>Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier</b>		


Nota : la limite de détection du laboratoire est < à 10µg/m<sup>2</sup>

#### Généralités :

- ⇒ **Taux en augmentation dans la base-vie.**
- ⇒ Aucune alerte particulière en zone publique.
- ⇒ **Taux en augmentation sur certaines zones du chantier.**

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

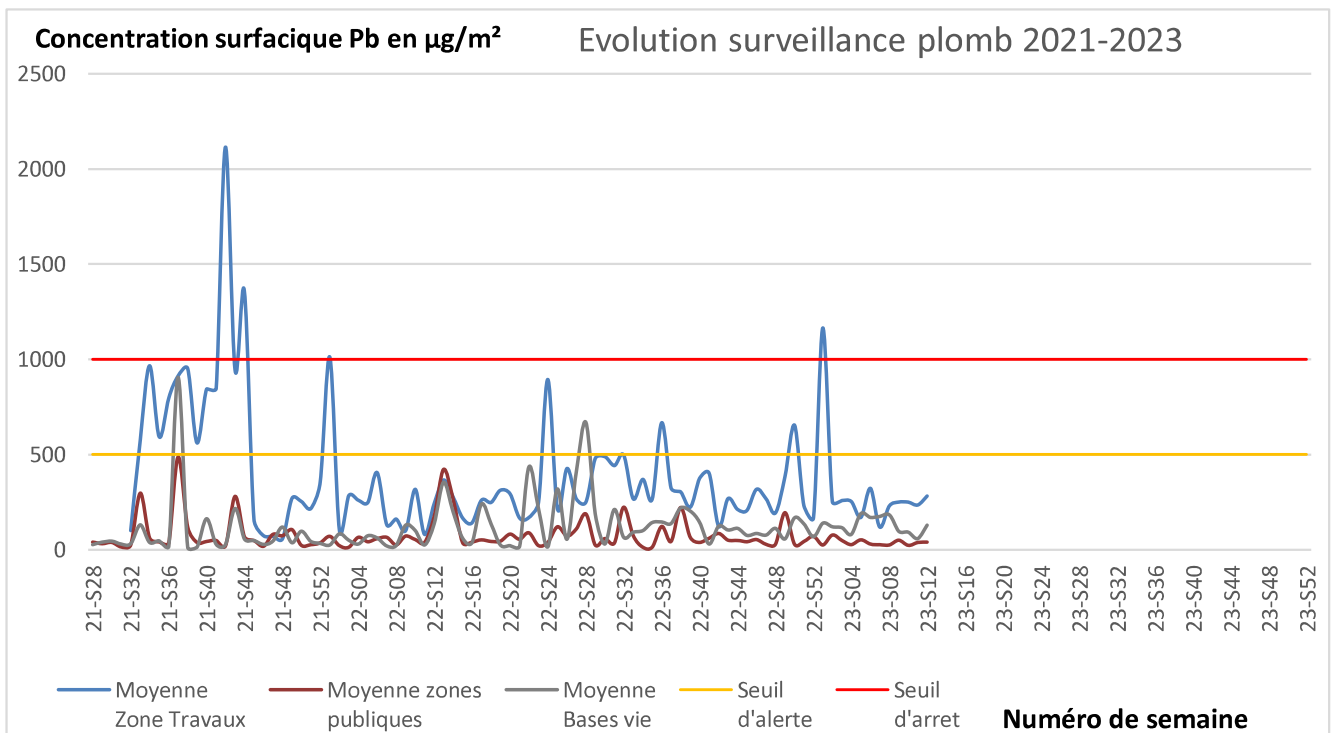

## Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélevement	Localisation	Support	Concentration $\mu/m^2$	Remarque
<b>HALL 1 - Zone sous PHV</b>				
P 01	Sous PHV - coté Chalon - coté Nord	Carrelage	21,60	
P 02	Sous PHV - coté Chalon - coté Sud	Carrelage	22,00	
P 03	Sous PHV - centre	Carrelage	60,80	
P 04	Sous PHV - coté Bercy - coté Nord	Carrelage	210,00	
P 05	Sous PHV - coté Bercy - Centre	Carrelage	18,80	
P 06	Sous PHV - coté Bercy - coté Sud	Carrelage	35,20	
<b>Moyenne :</b>			<b>61,40</b>	
<b>HALL 1 - Entrée</b>				
P 07	Bercy	Carrelage	14,40	
P 08	Parvis - Sud	Carrelage	25,60	
P 09	Parvis - Nord	Carrelage	21,60	
P 10	Chalon - salle des fresques	Carrelage	15,20	
<b>HALL 1 - Quai transversal</b>				
P 11	Zone Nord	Carrelage	21,20	
P 12	Zone Sud	Carrelage	17,60	
<b>Moyenne :</b>			<b>19,40</b>	
<b>Hall 1 - surveillance sur bache de protection PHV - Coté Nord</b>				
<b>Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :</b>			<b>40,33</b>	

### Commentaires / analyses

⇒ RAS

### Mesures correctives

⇒ RAS

### Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage
- ⇒ Maintenir pour l'ensemble des intervenants, le niveau actuel d'exigence du respect des procédures

PLY-PHV - N38 - Plan de localisation des analyses MOA

