

## GARE PARIS LYON

### ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 84

Date de diffusion	<b>03/03/2023</b>	<b>DESTINATAIRES :</b>	
Réf Rapport : ALEA CONTROLES	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>21-02-2023</b>
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	<b>Rapports brut laboratoire</b>	Date de prélèvement	<b>20-02-2023</b>
Semaine de surveillance	<b>Semaine 08-23</b>	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
<b>Objet :</b>	<b>Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb</b> <b>Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier</b>		


**Nota : la limite de détection du laboratoire est < à 10µg/m<sup>2</sup>**

#### Généralités :

- ⇒ Aucune alerte dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

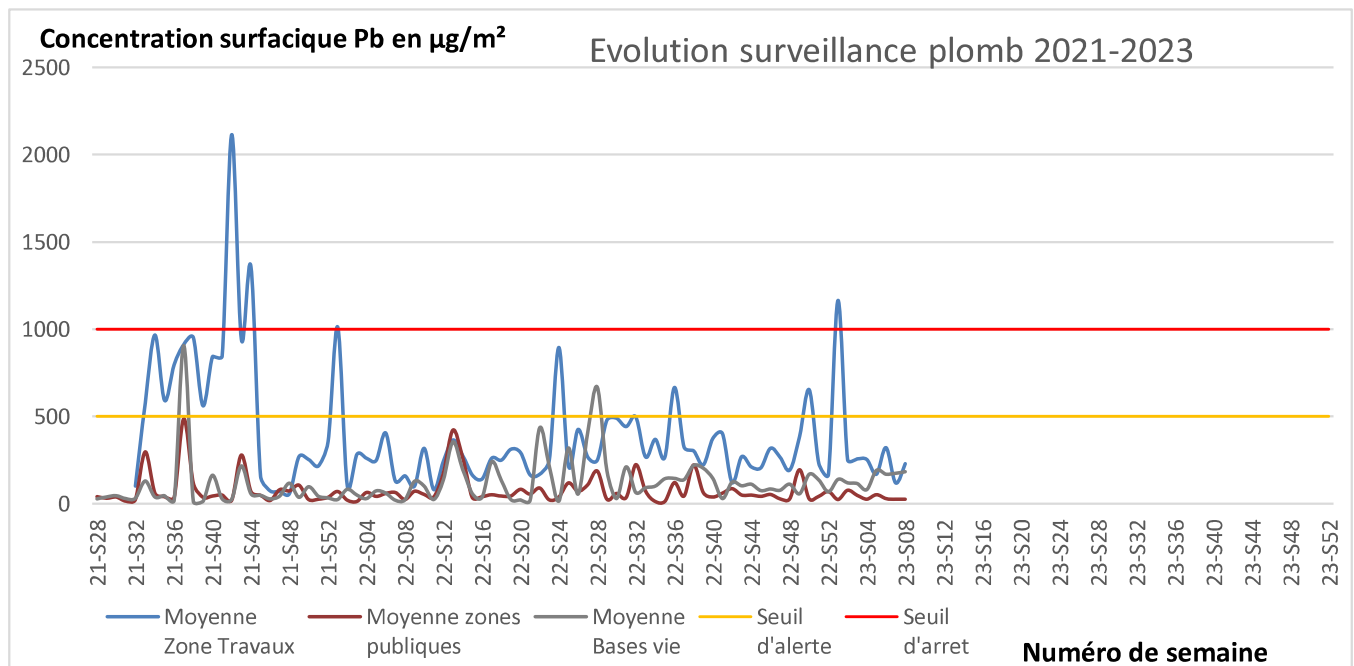

## Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélevement	Localisation	Support	Concentration $\mu/m^2$	Remarque
<b>HALL 1 - Zone sous PHV</b>				
P 01	Sous PHV - coté Chalon - coté Nord	Carrelage	12,40	
P 02	Sous PHV - coté Chalon - coté Sud	Carrelage	49,60	
P 03	Sous PHV - centre	Carrelage	34,80	
P 04	Sous PHV - coté Bercy - coté Nord	Carrelage	14,40	
P 05	Sous PHV - coté Bercy - Centre	Carrelage	10,00	
P 06	Sous PHV - coté Bercy - coté Sud	Carrelage	50,00	
<b>Moyenne :</b>			<b>28,53</b>	
<b>HALL 1 - Entrée</b>				
P 07	Bercy	Carrelage	13,20	
P 08	Parvis - Sud	Carrelage	45,20	
P 09	Parvis - Nord	Carrelage	43,20	
P 10	Chalon - salle des fresques	Carrelage	10,00	
<b>HALL 1 - Quai transversal</b>				
P 11	Zone Nord	Carrelage	10,00	
P 12	Zone Sud	Carrelage	10,00	
<b>Moyenne :</b>			<b>10,00</b>	
<b>Hall 1 - surveillance sur bache de protection PHV - Coté Nord</b>				
<b>Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :</b>			<b>25,23</b>	

### Commentaires / analyses

⇒ RAS

### Mesures correctives

⇒ RAS

### Mesures préventives

⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage

PLY - PHV - N38 - Plan de localisation des analyses MOA

