

GARE PARIS LYON

ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 90

Date de diffusion	06/04/2023	DESTINATAIRES :	
		AREP – GARE ET CONNEXIONS - PARVIS	
Réf Rapport : ALEA CONTROLES	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	03-04-2023
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	03-04-2023
Semaine de surveillance	Semaine 14-23	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles	
Objet :	Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier		


Nota : la limite de détection du laboratoire est < à 10µg/m²

Généralités :

- ⇒ **Certains prélèvements en légère augmentation dans la base-vie.**
- ⇒ Aucune alerte particulière en zone publique.
- ⇒ **Plusieurs points sont supérieurs aux seuils d'alerte en zone chantier.**

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←

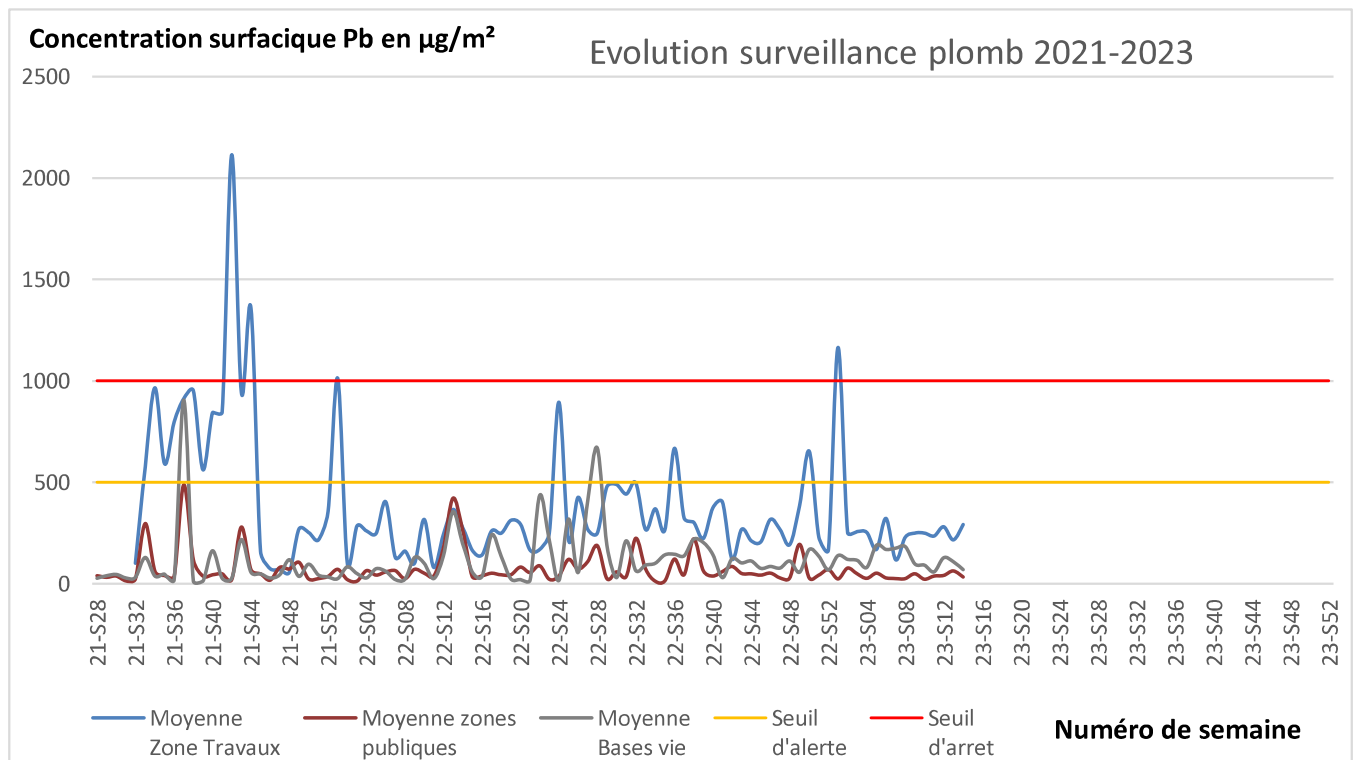

Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N° prélevement	Localisation	Support	Concentration μ/m^2	Remarque
HALL 1 - Zone sous PHV				
P 01	Sous PHV - coté Chalon - coté Nord	Carrelage	23,60	
P 02	Sous PHV - coté Chalon - coté Sud	Carrelage	22,40	
P 03	Sous PHV - centre	Carrelage	67,60	
P 04	Sous PHV - coté Bercy - coté Nord	Carrelage		non prélevé. En travaux
P 05	Sous PHV - coté Bercy - Centre	Carrelage	62,40	
P 06	Sous PHV - coté Bercy - coté Sud	Carrelage	29,20	
Moyenne :			41,04	
HALL 1 - Entrée				
P 07	Bercy	Carrelage	10,00	
P 08	Parvis - Sud	Carrelage	48,00	
P 09	Parvis - Nord	Carrelage	11,20	
P 10	Chalon - salle des fresques	Carrelage	17,60	
HALL 1 - Quai transversal				
P 11	Zone Nord	Carrelage	26,40	
P 12	Zone Sud	Carrelage	39,60	
Moyenne :			33,00	
Hall 1 - surveillance sur bache de protection PHV - Coté Nord				
Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :			32,55	

Commentaires / analyses

⇒ RAS

Mesures correctives

⇒ RAS

Mesures préventives

- ⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage
- ⇒ Maintenir pour l'ensemble des intervenants, le niveau actuel d'exigence du respect des procédures

PLY-PHV - N38 - Plan de localisation des analyses MOA

